

# 2024

## RELATÓRIO DE PROGRESSO 1º SEMESTRE











Item	PAP 2023-2026				Atividade	Valores				Status Geral		Status Detalhado							Contrato					Observações			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação		Total Alocado	Total Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura		Data de Término Prevista	Data de Término Atual	Data de Término Real
79	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	IV Simpósio de Recursos Hídricos   Gestora de Eventos	R\$ 1.323,33	R\$ 1.323,33	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Dueto Produções	05/03/2023	05/04/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	-	
80	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites   2022-2024	R\$ 10.715,68	R\$ 7.056,97	R\$ 3.658,71	65,86%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		SH Caetano Serviços de Informática e Comércio	044/2022	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2024		-	
81	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de Social Media e audiovisual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	-
82	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	XXV ENCOB (2023)   Materiais personalizados (adernos, lápis, bolsas)	R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
83	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	XXV ENCOB (2023)   Montagem e ambientação de stand	R\$ 12.485,02	R\$ 12.485,02	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - Rebob	039/2023	10/08/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-	
84	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Elaboração de cartilhas educacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	-	
85	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Atualização do site e da identidade visual do Comitê	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	-	
86	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2021-2022	R\$ 1.150,56	R\$ 1.150,56	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Alcãa Serviços de Tecnologia	023/2021	06/07/2021	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	-	
87	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2022-2023	R\$ 1.397,52	R\$ 1.397,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Alcãa Serviços de Tecnologia	043/2022/AGEVAP	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	-	
88	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2023-2024	R\$ 1.494,58	R\$ 996,40	R\$ 498,18	66,67%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		LR da Motta Marketing e Publicidade	054/2023	06/10/2023	10/10/2024	10/10/2024		-	
89	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acevo fotográfico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	
90	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Contratação de Serviços de Fotografia, Filmagem e Vídeo-Documentário - Projeto "Da Nascente à Foz"	R\$ 11.830,00	R\$ 11.830,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Equipe GP Mastersound	022/2016/AGEVAP	30/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	30/07/2016	-	
91	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Contratação de Serviço de Oficinas Ambientais nas Escolas e Apresentação de Cenas de Teatro - "Teatro do Oprimido" - Projeto "Da Nascente à Foz"	R\$ 5.854,00	R\$ 5.854,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	M. M. de Carvalho Producoes	016/2016/AGEVAP	28/03/2016	13/05/2016	26/06/2016	26/06/2016	-	
92	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	AGente das Águas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	
93	-	-	-	-	Plano de Bacia - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	001/2018/AGEVAP	09/01/2018	17/07/2020	17/07/2021	17/07/2021	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos da bacia federal e bacias estaduais.	

**Observações**

- Considerados os valores repassados à AGEVAP e alocados em atividades e desembolsados pela AGEVAP até 30/06/2024.
- Importante destacar que, como previsto na Cláusula Quarta, parágrafo terceiro do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.
- Item 93 - Resolução CERHI nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

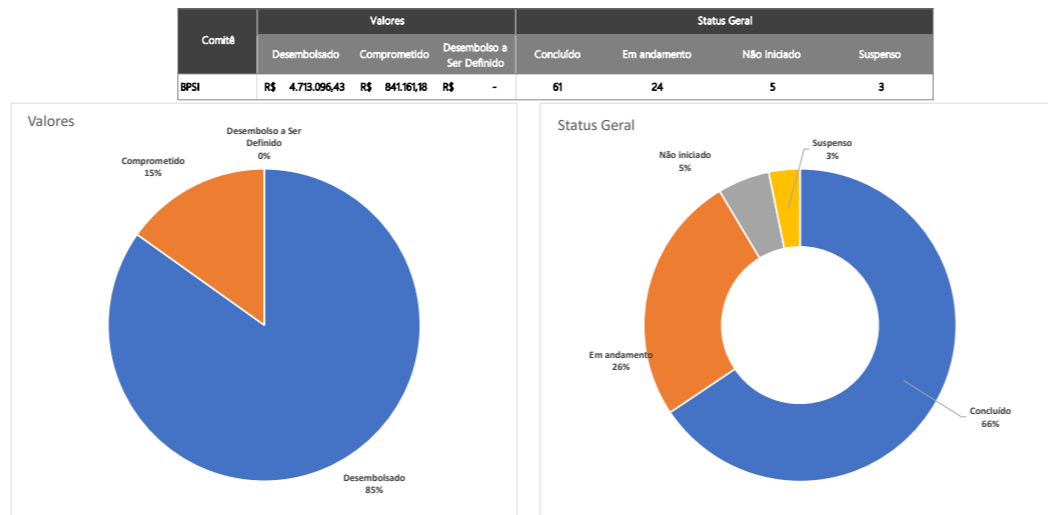








Table with columns: Item, Agenda, Subagenda, Programa, Ação, Atividade, Valores (Total de Recursos, Total Desembolsado, A desembolsar, % desembolso), Status Geral (Status, %), Status Detalhado (A ser iniciado, Elaboração de Edital de Convocação, Tramitação para Publicação do Edital, Acompanhamento Edital, Elaboração de TR, Tramitação para Publicação do Ato Convocatório, Ato Convocatório, Execução, Concluído), Contrato (Empresa/ Consórcio, Nº Contrato/ Convênio, Data de Assinatura, Data de Término Prevista, Data de Término Atual, Data de Término Real), Observações.













Item	PAP 2023-2026				Atividade	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações		
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação		Total de Recursos	Total Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Atual	Data de Término Real
139	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	III Concurso de Boas Práticas Ambientais	R\$ 3.763,00	R\$ 3.763,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
140	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Assessoria Técnica   Desenvolvimento de Ações do FBH-MPS	R\$ 204.488,73	R\$ -	R\$ 204.488,73	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Tractebel Engineering	068/2023	13/12/2023	01/06/2026	01/06/2026			
141	-	-	-	-	Plano de Bacia - Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	001/2018	09/01/2018	17/07/2020	17/07/2021	17/07/2021	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos de Bacia federal e bacias estaduais. Planos de Bacia da RH-III aprovado pelo Comitê.	

**Observações**

1. Considerados os valores repassados e desembolsados pela AGEVAP até 30/06/2024.
2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Quarta, parágrafo terceiro do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.
3. Item 141 - Resolução CERHI nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Médio Paraíba do Sul.

Comitê	Valores			Status Geral			
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspensão
MPS	R\$ 11.250.280,54	R\$ 4.162.743,25	R\$ 28.217,38	83	44	11	3

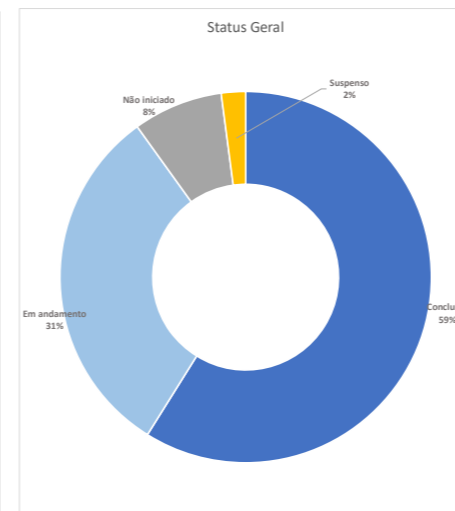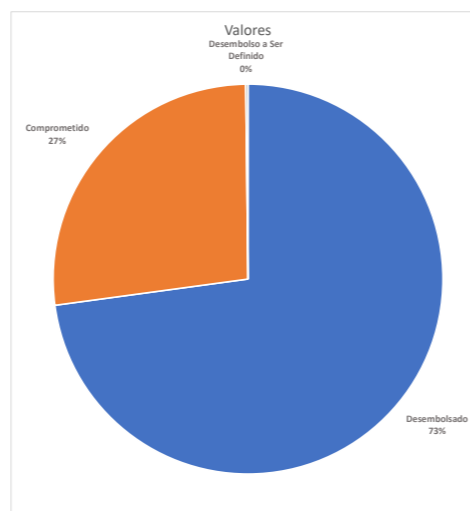











Item	PAP 2023-2026				Atividade	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato						Observações	
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação		Total de Recursos	Total Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual		Data de Término Real
93	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Estagiários	R\$ 43.756,02	R\$ 6.226,38	R\$ 37.529,64	14,23%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
94	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de camisas   2023	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Megabor Indústria e Comércio de Equipamentos e Vestuário	012/2023/AGEVAP	14/03/2023	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	-	
95	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites   2022-2024	R\$ 10.715,68	R\$ 7.056,97	R\$ 3.658,71	65,86%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	SH Gestano Serviços de Informática e Comércio	044/2022	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2024	-	-		
96	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2021-2022	R\$ 1.150,56	R\$ 1.150,56	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Alcãa Serviços de Tecnologia	023/2021	06/07/2021	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	-	
97	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2022-2023	R\$ 1.397,52	R\$ 1.397,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Alcãa Serviços de Tecnologia	043/2022	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	-	
98	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2023-2024	R\$ 1.494,58	R\$ 996,40	R\$ 498,18	66,67%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	LR da Motta Marketing e Publicidade	054/2023	06/10/2023	10/10/2024	10/10/2024	-	-		
99	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação da Revista 4 Águas e do resumo executivo do Plano de Bacia	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	TIKINET Academic	037/2023	03/08/2023	03/02/2024	03/02/2024	03/02/2024	-	
100	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão da Revista 4 Águas   2023 e do resumo executivo do Plano de Bacia	R\$ 21.285,00	R\$ 21.285,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Gráfica CS	043/2023	24/08/2023	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	-	
101	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação da Revista Quatro Águas   2024, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	-
102	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de Social Media e audiovisual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	-
103	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Azervo fotográfico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	-
104	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Placas de aço inox com gravação baixo relevo para homenagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	-





Item	PAP 2023-2026				Atividade	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato						Observações		
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação		Total de Recursos	Total Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Atual		Data de Término Real	
105	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	R\$ 14.633,38	R\$ 14.633,38	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Programa de Mobilização e Educação Ambiental	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	-	-
107	-	-	-	-	Plano de Bacia - Comitê Piabanha	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	001/2018/AGEVAP	09/01/2018	17/07/2020	17/07/2021	17/07/2021	-	-	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos da bacia federal e bacias estaduais.

**Observações**

- Considerados os valores repassados à AGEVAP e alocados em atividades e desembolsados pela AGEVAP até 30/06/2024.
- Importante destacar que, como previsto na Cláusula Quarta, parágrafo terceiro do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, neste relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.
- Item 107 - Resolução CERH nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itapococa. Valores apresentados representam somente o Comitê Piabanha.

Comitê	Valores			Status Geral			
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspensão
Piabanha	R\$ 3.853.751,28	R\$ 2.417.483,06	R\$ -	65	33	8	1

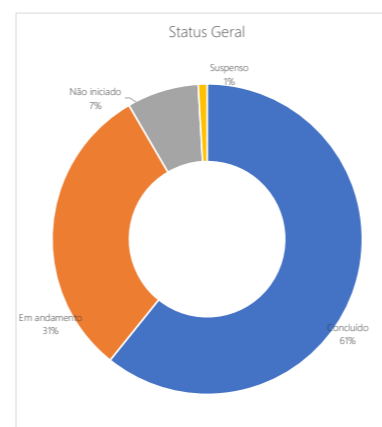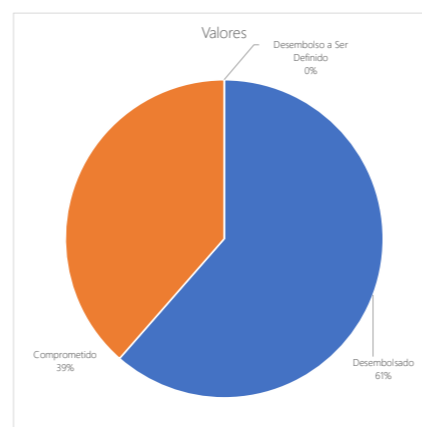



## RELATÓRIO DE PROGRESSO

Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020

Ações desenvolvidas pelo Comitê Rio Dois Rios



23	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Assessoria Técnica e Administrativa   Projetos SES	R\$ 76.849,58	R\$ 17.610,87	R\$ 59.238,71	22,92%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	DHF Consultoria e Engenharia	03/6/2023	27/07/2023	07/11/2025	07/11/2025	-	
24	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTATAR II   Santa Maria Madalena (Largo do Machado)	R\$ 188.164,64	R\$ 188.164,64	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	PM Santa Maria Madalena	0535937-58/2019/CAIXA	06/12/2019	06/12/2023	06/12/2024	-	
25	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTATAR II   Santa Maria Madalena (Centro e Itaporanga)	R\$ 1.610.085,12	R\$ 1.610.085,12	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	PM Santa Maria Madalena	04/2023	06/12/2023	24/05/2026	24/05/2026	-	
26	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTRATAR IV   São Fidélis	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ -	100,00%	Cancelado	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Recursos devolvidos.	
27	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Programa Mananciais CEIVAP   Capacitação na microbiologia do Barracão dos Mendes	R\$ 90.866,24	R\$ -	R\$ 90.866,24	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Geovix Planejamento Ambiental	03/4/2023	19/07/2023	12/03/2025	12/03/2025	-	
28	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Diagnóstico e Intervenção   Projetos para intervenções em áreas de recuperação ambiental	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	
29	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Projeto Diagnóstico e Intervenção - Atividades de Geoprocessamento	R\$ 218.311,27	R\$ 218.311,27	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Esta ação não está vinculada a um contrato administrativo de prestação de serviços.	
30	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	-	Impressão de Materiais Gráficos	R\$ 6.292,00	R\$ 6.292,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
31	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Execução do Plano de Comunicação	R\$ 75.002,50	R\$ 26.457,50	R\$ 48.545,00	35,28%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Groove Propaganda	04/4/2023	24/08/2023	06/09/2024	06/09/2024	-	
32	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites   2022-2024	R\$ 10.715,68	R\$ 7.056,97	R\$ 3.658,71	65,86%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	SH Caetano Serviços de Informática e Comércio	04/4/2022	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2024	-	
33	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Impressão da Revista 4 Águas   2023	R\$ 1.535,00	R\$ 1.535,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Gráfica CS	04/3/2023	24/08/2023	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	
34	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	XXV ENCOB (2023)   Materiais personalizados (caderno, lapis e bolsa)	R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
35	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	XXV ENCOB (2023)   Montagem e ambientação de stand	R\$ 12.485,02	R\$ 12.485,02	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - ReboB	03/9/2023	10/08/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	
36	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2021-2022	R\$ 1.150,56	R\$ 1.150,56	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Aicaia Serviços de Tecnologia	02/3/2021	06/07/2021	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	
37	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2022-2023	R\$ 1.397,52	R\$ 1.397,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Aicaia Serviços de Tecnologia	04/3/2022	08/09/2022	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	
38	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência   2023-2024	R\$ 1.494,58	R\$ 996,40	R\$ 498,18	66,67%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	LR da Motta Marketing e Publicidade	05/4/2023	06/10/2023	10/10/2024	10/10/2024	-	
39	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Acevo fotográfico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	
40	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Diagramação da Revista Quatro Águas, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	
41	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Serviços de Social Media e audiovisual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-	
42	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Premiação do Concurso de Curtas	R\$ 16.294,72	R\$ 16.294,72	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
43	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Agente das Águas	R\$ 655.000,00	R\$ 655.000,00	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Fiolec/Fiocruz	02/8/2022	12/04/2022	12/04/2027	12/04/2027	-	
44	-	-	-	-	Plano de Bacia - Comitê Rio Dois Rios	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	001/2018/AGEVAP	09/01/2018	17/07/2020	17/07/2021	17/07/2021	Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos da bacia federal e bacias estaduais.

## Observações

- Considerados os valores repassados à AGEVAP e alocados em atividades e desembolsados pela AGEVAP até 30/06/2024.
- Importante destacar que, como previsto na Cláusula Quarta, parágrafo terceiro do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas à transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.
- Item 44 - Resolução CERH nº 147/2015; aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul, Pílabinha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itapoaína. Valores apresentados representam somente o Comitê Rio Dois Rios.



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 30/08/2024 11:04:02

A autenticidade deste documento 00034.002731/2024-88 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 329371.

Comitê	Valores			Status Geral				
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Devido	Concluído	Em andamento	Não Iniciado	Cancelado	Suspensão
R2R	R\$ 5.653.823,28	R\$ 602.302,70	R\$ -	23	20	0	1	0

